

Bilag 1


Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Naturstyrelsen Trekantsområdet ønsker at genoprette den naturlige hydrologi ved Lyngmosen i Sdr. Stenderup Sønderkov i Kolding Kommune. <i>Projektelementer:</i> 1. Terrænregulering i den sydlige ende af Lyngmosen således at vandet tilbageholdes i Lyngmosen. 2. Etablering af justerbar tærskel med udløb til vandløbet syd for mosen. 3. Knusning/fjernelse af eksisterende rørlægning ved udløbet fra Lyngmosen. Desuden ansøges der om etablering af ca. 435 meter åbent vandløb på en strækning, hvor vandløbet i dag løber rørlagt i bunden af en dyb grøft. Herved skabes der et nyt åbent vandløb med gode fysiske forhold og der sikres fri passage for fisk og smådyr i hele vandløbet. Projektet vil bidrage til målopfyldelse i vandløbet. Målsætningen er i dag ikke opfyldt, jf. vandområdeplanerne for 2021-2027. <i>Projektelementer:</i> 1. Gravning af nyt ca. 295 meter åbent vandløb 2. Åbning af ca. 130 meter rørlagt vandløb (25 + 105 meter) 3. Fjernelse af eksisterende brønd og ind- og udløbsbygværk 4. Etablering af ca. 10 meter lang Ø60 - Ø80 cm rørbro 5. Knusning eller fjernelse af rørlagt vandløb ca. 10 steder på den ca. 250 meter lange strækning, hvor der etableres et nyt åbent vandløb. Der foretages desuden en tilfyldning af grøften, med overskudsjord fra det nye vandløbs-profil. 6. Udlægning af grus og sten på vandløbsbunden gennem hele strækningen. 7. Åbning af to korte rørlagte strækninger længere nedstrøms projektområdet. Se desuden vedlagte screeningsnotat for yderligere detaljer.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Naturstyrelsen Trekantsområdet Førstballevej 2, 7183 Randbøl Tlf. +45 72 54 30 00 tre@nst.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Marc Hammer Holck Førstballevej 2, 7183 Randbøl Tlf. +45 21 66 25 28 mhhol@nst.dk Rasmus Christiansen Førstballevej 2, 7183 Randbøl Tlf. +45 20 72 85 73 rasmc@nst.dk
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Projektet omfatter følgende matrikler: Matrikel nr. 144A Ejerlav: Sdr. Stenderup By, Sdr. Stenderup

Kolding Kommune

☐ Projektområde - Sdr. Stenderup Sønderkov

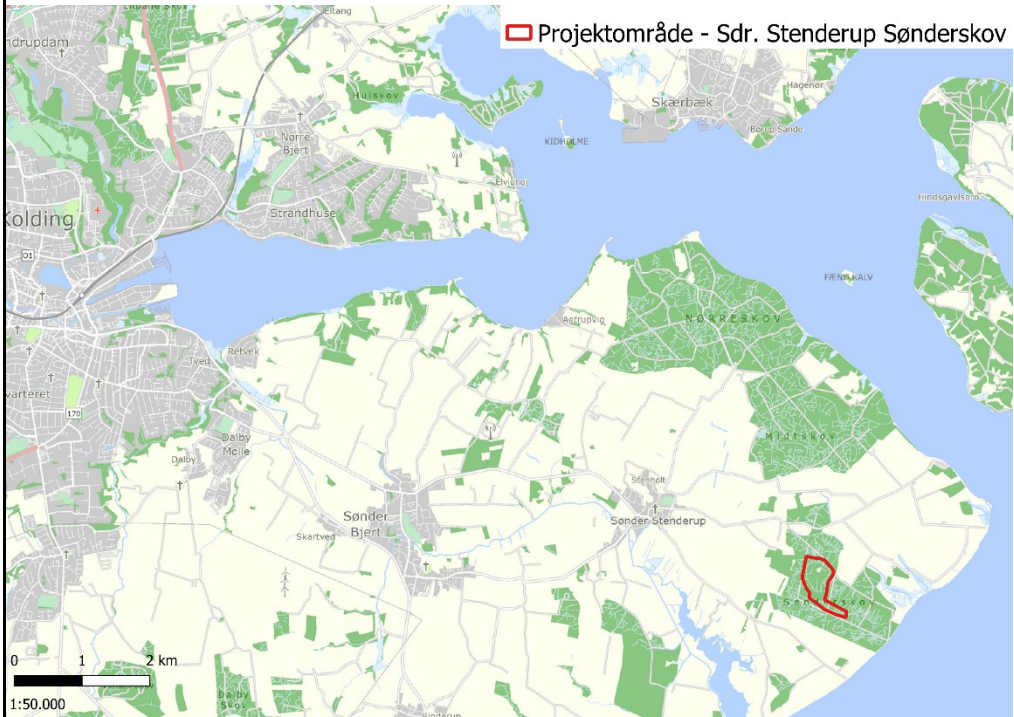


Projektelementer

-  Lyngmosen projektområde
 Nuværende udløb
 Tærskel
 Terrænregulering Lyngmosen
 Nyt vandløb Sønderkov

§3 naturtyper

-  Eng
 Hede
 Mose
 Overdrev
 Strandeng
 Sø
 Vandløb

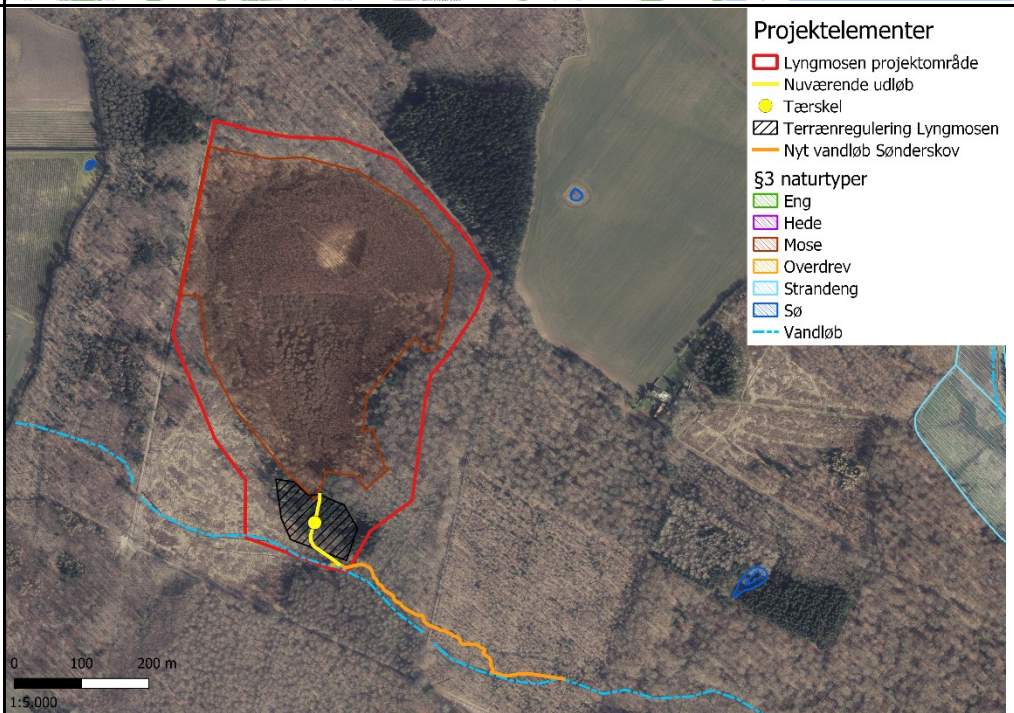

Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: pkt. 10 f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb. Pkt. 10 g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Ikke relevant		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Arealet er udlagt til urørt skov. Efter projektets realisering vil området generelt blive vådere. Det antages at træbevoksning i Lyngmosen de mest vandlidende steder vil forsvinde grundet den øgede vandstand og dermed vil den primære vegetationstype være fugtigbundsvegetation fremover. Projektet indbefatter ikke bebyggelse. Der befæstes ikke arealer i forbindelse med projektet.		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Nej Projektområde: ca. 25 ha. 0 0 0 0 Ingen nedrivningsarbejde		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde:	Projektet omfatter ikke behov for råstoffer i væsentlige mængder. Der vil dog være behov for tilførsel af materialer til terrænregulering, tærskel og vandløbsrestaurering. Herunder stenmaterialer til vandløbsrestaurering samt ler og muldjord til terrænreguleringen ved Lyngmosen, således der skabes et ikke-permeabelt dige. Der forventes at skulle anvendes ca. 200m ³ jordmaterialer til terrænreguleringen.		

Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Anlægsarbejderne omfatter ikke forbrug af vand eller produktion af affald eller spildevand. Der er ikke særlige foranstaltninger i forhold til håndtering af regnvand i anlægsperioden. Regnvand i anlægsperioden afstrømmer fra terræn. Anlægsarbejdet er planlagt udført i i sensommeren/tidligt efterår 2025. Selve anlægsopgaven forventes at have en varighed på én uge.		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Behovet for råstoffer i anlægsperioden er af mindre omfang. Der er altså ikke et væsentligt behov for opbevaring. I forbindelse med selve anlægget vil der dog evt. skulle opbevares stenmateriale og jordmateriale nær projektområdet, i en meget kort periode. Alt materiale opbevares på egen matrikel (144a) nær projektet.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Ikke relevant		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.

11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?			Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	Der vil ikke foregå rydning af skov i forbindelse med projektet. Der ryddes som udgangspunkt heller ikke enkeltstående træer i projektet, medmindre det er nødvendigt for slyngningen af det nye forløb. Der vil uanset ikke blive fældet værdifulde træer med hulheder og lignende.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens §3.			Lyngmosen er en §3-beskyttet mose. Vandløbsrestaurering af det §3-beskyttede vandløb Østergård Bæk (DK vandområde id: o4424).

32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?	X		Løvfrø (<i>Hyla arborea</i>) Havørn (<i>Haliaeetus albicilla</i>)
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Ca. 50 m fra projektområdet er det fredede område Stenderup Hage.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Projektområdet er beliggende i Natura 2000-området nr. 112 Lillebælt, Fuglebeskyttelsesområde F47 og Ramsarområde R15. Selve projektet ligger udenfor Habitatområde H96, der ellers er en del af Natura 2000-området.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X		Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Fysisk ændring af vådområder (Lyngmosen) ved ændring af udløb fra mosen med tærskel samt vandløbsrestaurering ved etablering af ny vandløbsprofil.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	X		Ifm. udlægning af urørt skov, planlægges flere grøfter lukket med "prop" for at genetablere hydrologien i Sdr. Stenderup Sønderskov. Skoven vil derfor generelt fremstå vådere i fremtiden. Vi er dog ikke på nuværende tidspunkt klar med ansøgning til disse hydrologiprojekter i skoven, da de kræver yderligere planlægning. Disse projekter er funktionelt uafhængige, da de foregår i andre vandløb/grøftesystemer. Derudover planlægges der afgræsning i dele af skoven ifm. et lysåbent areal. Den kumulative effekt på miljøet vurderes ikke at være væsentlig.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte			Da der bl.a. er ynglende havørn i skoven, vil anlæg foregå uden for yngleperioden, således at artsfredningsbekendtgørelsen overholdes. Dette sker i overensstemmelse med Naturstyrelsens generelle praksis for brug af maskiner og skovning.

foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?		
---	--	--

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 29.01.2025 Bygherre/anmelder: Naturstyrelsen Trekantsområdet

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.
