

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 4.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	150 kV Mesballe (MES) REI Etablering af ny 150 kV station ved Mesballe. Flere detaljer findes i vedlagte projektbeskrivelse og bilag. • Bilag 1: Oversigtskort 1:50.000 for hele projektet • Bilag 2: Støjberegninger • Bilag 3: Visualisering • Bilag 4: Beplantningsplan • Bilag 5: Idékatalog Der er vedlagt shapefiler for projektet.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Energinet Tonne Kjærsvvej 65 7000 Fredericia Tlf.: 70 10 22 44 e-mail: info@energinet.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Tine Marquard Energinet, Miljøvurdering Øst Tonne Kjærsvvej 65 7000 Fredericia Tlf.: 3056 2432 e-mail: tmz@energinet.dk
Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4	Se shapefiler for placering af stationsareal og kabel fra overgangsmast til ny station.

hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).			
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Syddjurs Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se bilag 1. Placering fremgår derudover af medsendte shapefiler.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).			
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Projektet er omfattet af punkt 3c: "Transport af elektricitet gennem luftledninger, jordkabler dimensioneret til spændinger over 100 kV, samt tilhørende stationsanlæg, dog undtaget elkabler på søterritoriet (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1)."
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr.nr. og ejerlav	Bygherre ejer ikke de arealer som kabelanlægget etableres på.		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	<u>Kabelanlægget</u> Der skal etableres et kort kabelanlæg å ca. 770 m fra nyetableret overgangsmast til den nye station Mesballe. Kablets forløb markeres med røde markeringspæle på ca. 1 meters højde. Pælene placeres i markskel og ved vejkrydsningen ved Thorsagervej. Herudover vil der ikke være synlige anlæg over terræn.		


Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Der vil blive tinglyst en servitut med en bredde på 7 m over kabelanlægget, som ikke må bebygges eller tilplantes med træer med dybdegående rødder. Arealet vil dog kunne benyttes til almindelig landbrugsdrift. <u>Station</u> Der etableres ny 150 kV Mesballe station på matr.nr. 2æ Mesballe By, Skarresø. Stationen vil få et areal på ca. 2,2 ha. Der vil rundt om stationsarealet blive etableret beplantning og sivesø. I forbindelse med projektet demonteres eksisterende stationsanlæg drevet ved Energinet. Konstants anlæg forbliver på det eksisterende stationsareal. Befæstningsgraden vil på stationen med veje være på ca. 2.900 m². Befæstningsgraden på eksisterende station er ca. 900 m².						
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Projektets areal og volumenmæssige udformning: Der henvises til projektbeskrivelsen for en mere detaljeret beskrivelse af projektets arealbehov. Ligeledes til de medsendte shapefiler, som viser den fysiske afgrænsning af projektet. Er vurderes ikke behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet, da grundvandet i området er dybere end > 4-10 meter under terræn. Projektets samlede grundareal angivet i ha. ca. 5,3, hvor selve stationen får et areal på ca. 2,2 ha. <u>Kabelanlæg</u> Projektet omfatter en strækingsanlæg på ca. 770 m, hvor der tinglyses en servitut, som anslået i gennemsnit er 7 m bred. I alt lægger kabelanlægget i drift beslag på anslået ca. 5.400 m², hvor der vil være indskrænkninger i rådigheden. <u>Station:</u> <table><tr><th>Station</th><th>Eksisterende areal (m²)</th><th>Nyt areal (m²)</th></tr><tr><td>Mesballe</td><td>9.500</td><td>21.700</td></tr></table> Projektets bebyggede areal i m²: <u>Kabelanlæg</u> Kabelanlægget omfatter ikke bebyggede arealer. <u>Station</u> Den nye station vil få et areal på 233 m² Den vil blive 7,5 x 31 m, med en højde på 5,5 m. Projektets nye befæstede areal i m²: 2.900 m² <u>Kabelanlæg</u> Kabelanlægget omfatter ikke befæstede arealer. Projektets maksimale bygningshøjde i m: 25 m, som er opsatte lynfangsmaster. Øvrigt anlæg er mellem 8,5-12,5 meter. Eksisterende stationsareal drevet ved Energinet skal efter etableringen af den nye station, demonteres. Arealet er ejet af Konstant.	Station	Eksisterende areal (m²)	Nyt areal (m²)	Mesballe	9.500	21.700
Station	Eksisterende areal (m²)	Nyt areal (m²)					
Mesballe	9.500	21.700					


	Alle de el-tekniske komponenter fjernes, herunder eksisterende transformere. Materialet (stål, jern og aluminium) vil blive kørt til godkendt modtager og genanvendt. Olie fra transformeren håndteres som farligt affald, og vil også blive afleveret til godkendt modtager. Arealet hvorpå anlægget er placeret vil blive efterladt med almindeligt græs.
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Projektbeskrivelsen har en opgørelse over råstoffer, materialer og affald opgjort på kabelanlæg og stationer. Spildevand genereres alene fra skurbyer og mandskabsvogne som tilmeldes tømningsordning efter gældende regler. Regnvand fra tørholdelse af udgravninger under anlægsarbejdet vil blive bortledt lokalt til terræn på landbrugsarealer efter aftale med lodsejer. Det sikres inden bortledning, at vand bortledes til nedsivning i et punkt i terrænet minimum 25 m fra recipienter, og hvor hældningen er væk fra recipienter, samt at der ikke er risiko for, at det løber overfladisk af til nærliggende overfladevandsforekomster. Såfremt der mod forventning ikke kan sikres bortledning af vand ved nedsivning lokalt på terræn, og der bliver behov for udledning til recipient, er der tale om en projektændring af det ansøgte projekt Anlægsperioden for kabelanlægget vil være på ca. 1-2 måneder i perioden Q2 2024. Anlægsarbejdets varighed på den enkelte ejendom vil være 1-3 arbejdsdage. Ved underboringen under vejen kan arbejdsperioden være længere, forventeligt 3-5 dage Anlægsperioden for stationsbyggeriet, fra opstart til idriftsættelse, vil være ca. 18 måneder i perioden Q2 2024 – Q4 2025
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	I driftsfasen transporterer projektet strøm. Der er således ikke flow af råstoffer eller produkter og intet behov for vand i driftsfasen.
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Anlægget transporterer strøm, og der vil derfor ikke være affald, der skal håndteres i driftsfasen udover når anlægget skal vedligeholdes og udtjente komponenter må udskiftes. Kabelanlægget og stationsanlægget forventes at have en levetid på minimum 40 år. Spildevand fra manøvrebygningen vil blive tilmeldt opsamlingstank. Der vil omkring stationsarealet blive etableret sivesø til håndtering af overfladevand fra stationsarealet. Der vil ved transformere og kompenseringspole være etableres olieudskiller på afløbet inden udledning til sivesø.

	Manøvrebygning tilsluttes faskine. Der vil blive ansøgt om nedsivningstilladelse ved Syddjurs Kommune. Der er ikke behov for håndtering af regnvand langs strækningen.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?			Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Stationsanlæg er omfattet af følgende: - Vejl. nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" (Støjvejledningen) - Vejl. nr. 6/1984 "Måling af ekstern støj fra virksomheder" - Vejl. nr. 5/1993 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder" - Vejl. nr. 3/1996 "Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder" - Vejl. nr. 3/2003 "Ekstern støj i byomdannelsesområder" - Tillæg til vejl. nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" - Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø"


15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Inden arbejdet igangsættes vil det blive anmeldt til den lokale myndighed (anmeldelse af midlertidige aktiviteter, herunder støv-, støj- eller vibrationsfrembringende bygge- og anlægsarbejder). <u>Kabelanlæg</u> Der anvendes følgende almindelige entreprenørmaskiner; lastbil, gravemaskine, rendegraver, traktor. Maskinerne har forskellige kildestyrker, der kan sammenlignes med landbrugsmaskiner og varierer mellem 90 db til 110 db. Arbejdet tilpasses lokale forhold igennem tilrettelæggelsen af arbejdet. Med det grundlag for arbejdets udførelse og de beskrevne maskiner (se bilag 1) kan de vejledende støjkrav overholdes. <u>Station</u> Der anvendes følgende almindelige entreprenørmaskiner. [Maskinerne har forskellige kildestyrker, der kan sammenlignes med landbrugsmaskiner og varierer mellem 90 db til 110 db. Maskinerne bliver ikke anvendt kontinuert igennem anlægsfasen, men i afgrænsede perioder afhængig af anlægsarbejdet. Arbejdet tilpasses lokale forhold igennem tilrettelæggelsen af arbejdet. Med det grundlag for arbejdets udførelse og de beskrevne maskiner (se bilag 1) kan de vejledende støjkrav overholdes.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen <u>Kabelanlæg</u> Kabelanlægget i drift udsender ikke støj. <u>Station</u> Der er udarbejdet en støjberegning for Mesballe station og støjen fra stationen i alle driftssituationer vil være under de vejledende grænseværdier for støj udsendt af miljøstyrelsen. Støjberegning er vedlagt ansøgningen (bilag 2).
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?			Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	<u>Anlægsperioden</u> Anlægsarbejdet kan give midlertidige støvgener i tørre perioder. Generne kan afhjælpes gennem vanding af anlægsområdet, som Energinet udfører efter konkret vurdering eller hvis naboer klager. Desuden etableres alle køreveje ved hjælp af køreplader, som vil reducere støvgenerne. <u>Driftsfasen</u> Der vil ikke forekomme støvgener fra anlægget i driftsfasen.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	<u>Anlægsfase</u> I anlægsfasen vil der være lysgener i tilfælde af, at arbejdet udføres uden for dagtimerne eller i vinterhalvåret. Der vil blive anvendt belysning på midlertidige arealer for bygge- og oplagringspladser, for at der er sikre arbejdsforhold. For ikke at genere beboerne i omkringliggende ejendomme, er det vigtigt, at arbejdslys bliver placeret, således at lyset ikke generer omgivelserne unødigt. Dette er især vigtigt i bymæssig bebyggelse, hvor de nærmeste naboer er relativt tæt på arbejdsarealerne. <u>Driftsfase</u> Der vil ikke være belysning omkring kabelanlægget. Der vil blive etableret belysning på det nye stationsareal, ny Mesballe, som kun bruges ved serviceeftersyn og vedligehold, i de få timer indenfor normal arbejdstid, hvor der endnu ikke er lyst, hvilket vil være sæsonafhængigt.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Der er igangsat proces med udarbejdelse af lokalplan og kommuneplantillæg for ny station Mesballe. Kabelanlægget krydser ikke lokalplanlagte områder.

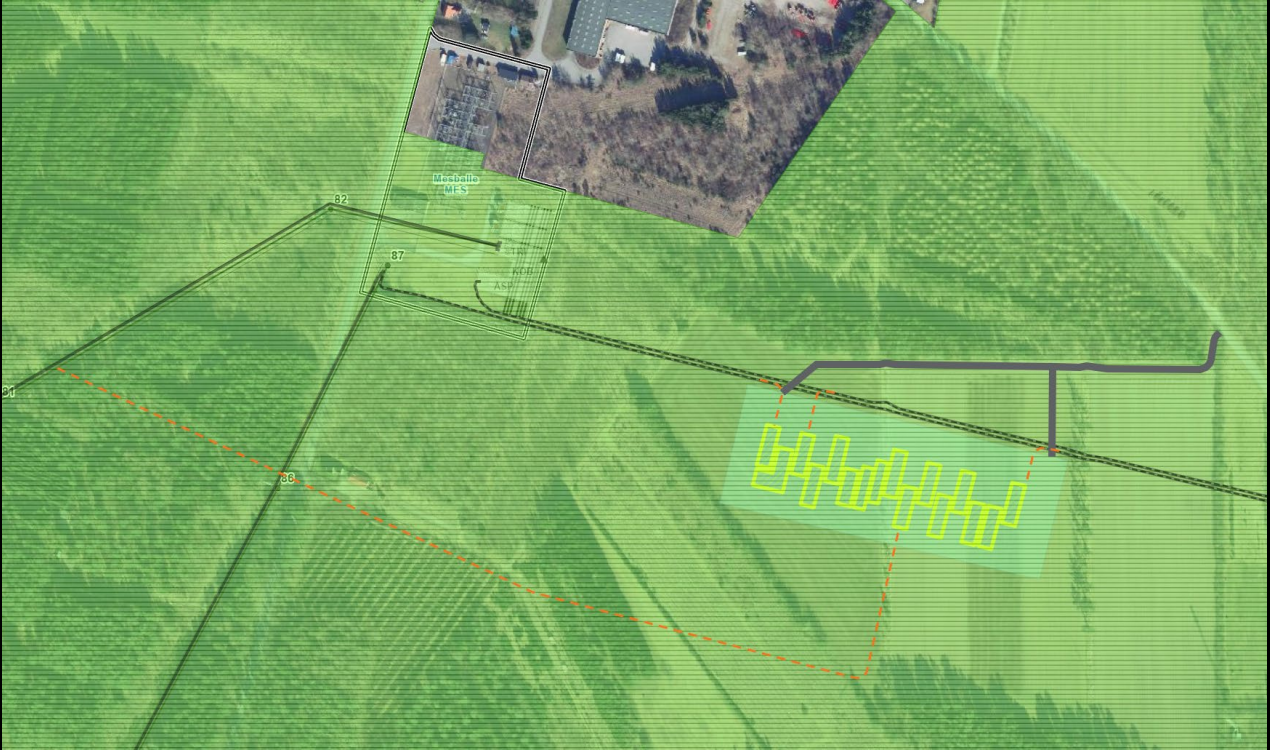25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?			 Stationsareal og kabelanlæg er beliggende indenfor skovbyggelinjen. Kabelanlægget efterlader ikke synlige spor i landskabet. Manøvrebygning på den nye station ligger indenfor skovbyggelinjen og kræver dispensation. Øvrige tekniske komponenter der etableres i projektet, er undtaget fra bestemmelserne om skovbyggelinjen.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		x	Projektet vil ikke medføre begrænsninger på anvendelsen af naboarealer i anlægs- og driftsfase.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	Stationen ligger ikke i udlagt råstofområde.
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst

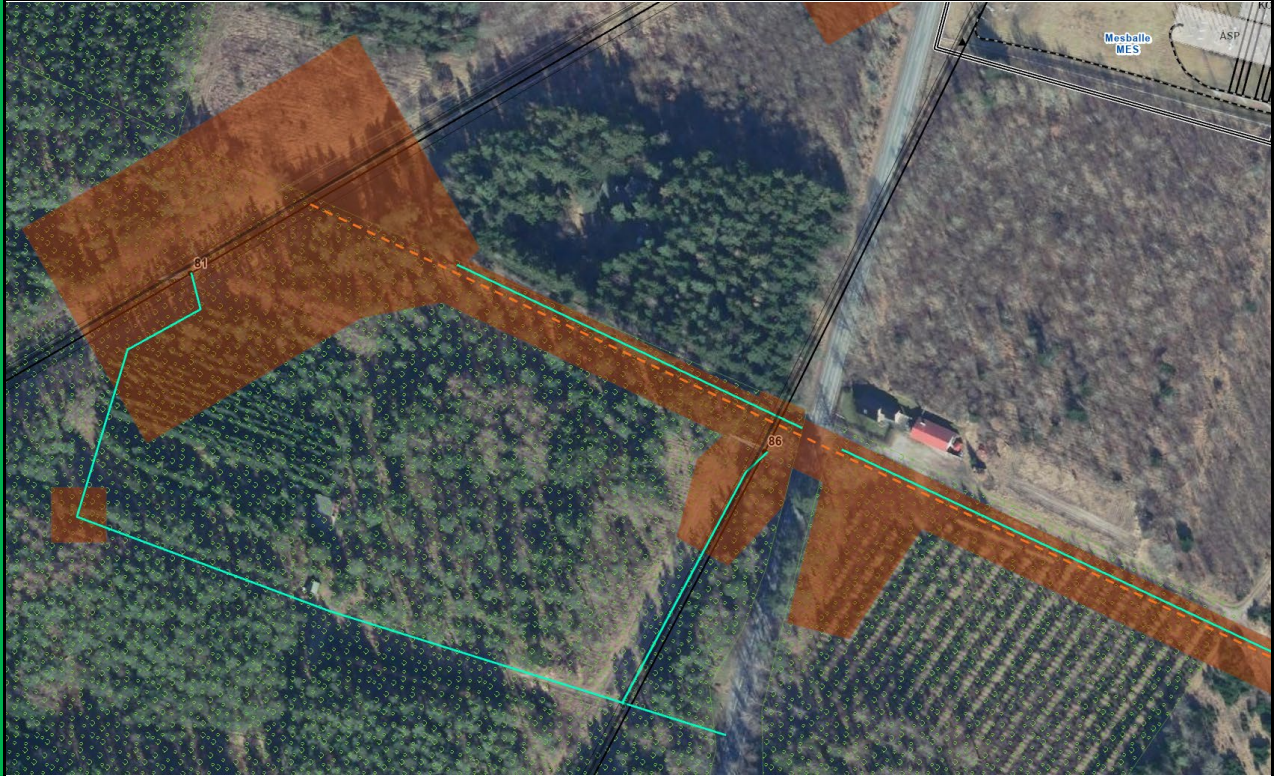29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)	x		 Den del af det nye kabelanlæg, der skal etableres fra ny overgangsmast til den nye Mesballe St. er placeret i kanten af fredskov. Der er tale om ca. 370 m. Der vil i kanten af fredskoven blive behov for rydning af træer og de nødvendige tilladelser efter skovloven vil blive indhentet. Ved krydsning af skov som ikke er fredskov vil arbejdsbæltet blive ryddet i anlægsfasen og kablet anlagt i rør i åben grav. Stationen ligger ikke i skovområde.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	Der er ikke kendskab til igangværende fredningssager i projektområdet.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i			Nærmeste § 3 beskyttet natur ligger ca. 430 m sydøst for det nye stationsareal. Der er tale om en beskyttet mose/sø.

henhold til
naturbeskyttelseslovens § 3.

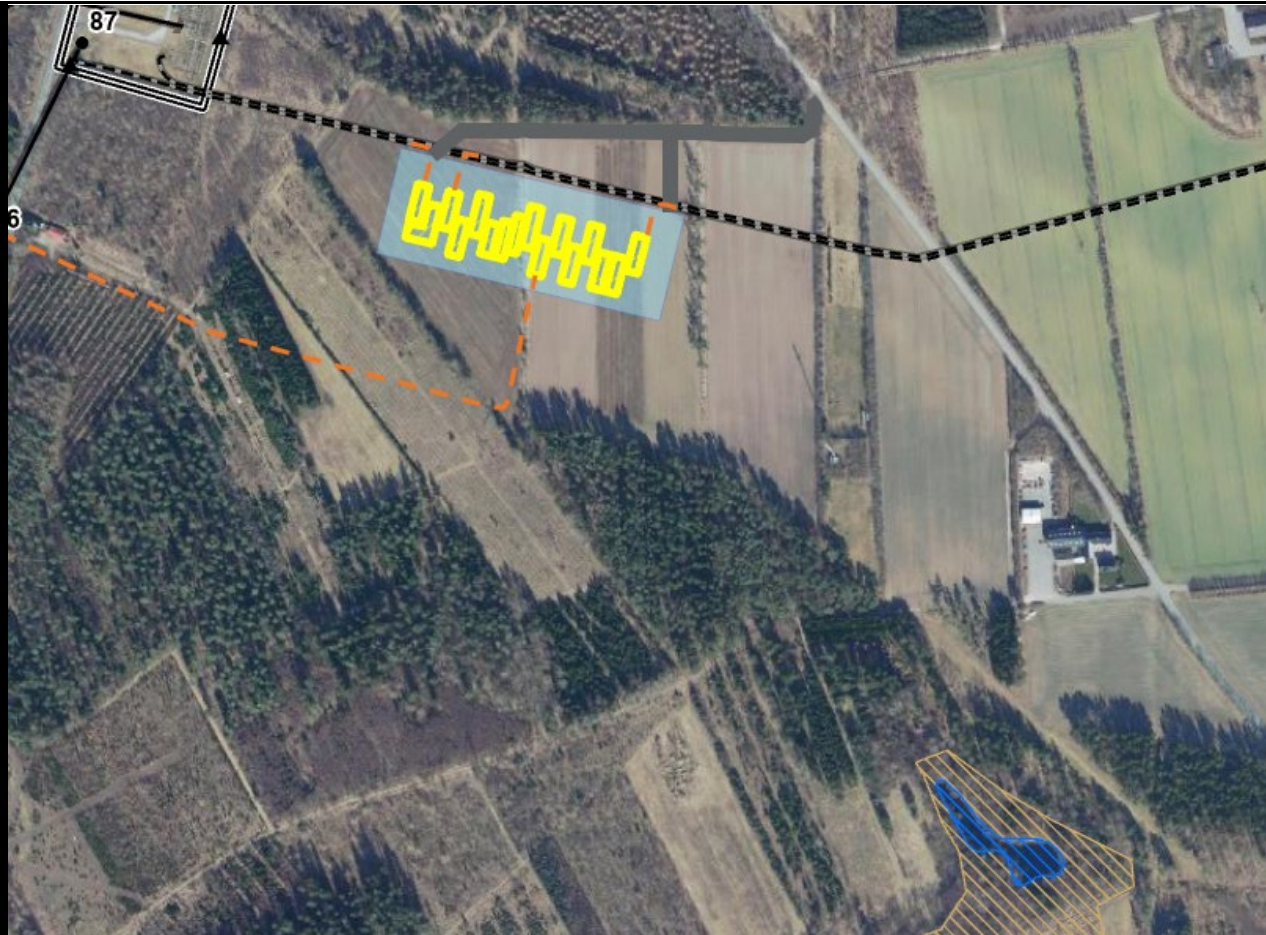

32. Er der forekomst af
beskyttede arter og i givet
fald hvilke?



x Se projektbeskrivelse.


33. Afstanden fra projektet i
luftlinje til nærmeste fredede
område.

Der er 1,3 km til nærmeste fredede område. Området er beliggende nord for ny Mesballe station. Der er tale om en arealfredning ved Gamle Ryomgård.



34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).

Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 8 km syd for det nye stationsområde i luftlinje. Området er Natura 2000-område nr. 230 Kaløskovene og Kalø Vig (Habitatområde H230).

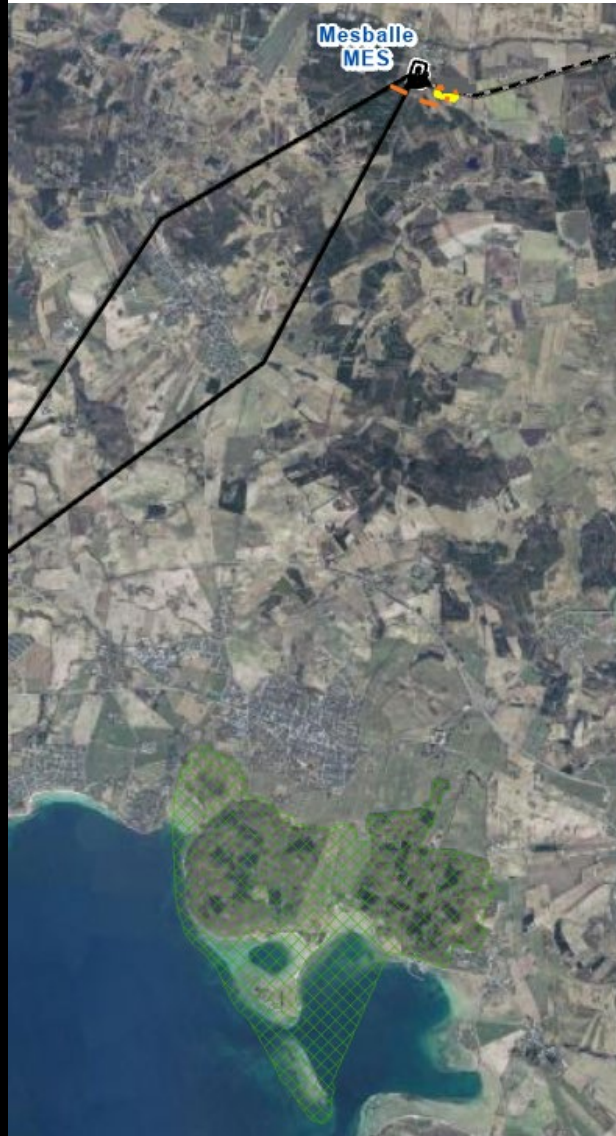

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Evt. grundvand fra tørholdelse af anlægget vil blive bortledt lokalt til terræn på landbrugsarealer efter aftale med lodsejer. Det sikres inden bortledning, at vand bortledes til nedsivning i et punkt i terrænet minimum 25 m fra recipienter, og hvor hældningen er væk fra recipienter, samt at der ikke er risiko for, at det løber overfladisk af til nærliggende overfladevandsforekomster. Såfremt der mod forventning ikke kan sikres bortledning af vand ved nedsivning lokalt på terræn, og der bliver behov for udledning til recipient, er der tale om en projektændring af det ansøgte projekt.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		x	Stationsområdet er ikke placeret indenfor område med særlig drikkevandsinteresser.
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x		Der er registreret V2 jordforurening indenfor det eksisterende stationsområde. Jorden håndteres efter jordforureningsloven, se projektbeskrivelsen.

			
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.	x		Ny Mesballe station er delvist placeret på et areal hvor der er vurderet risiko for oversvømmelser. Energinet har efter samtale med kommunen og vurdering af Bluespot kort fundet at risikoen for fremtidige oversvømmelser er i området syd og øst for stationsarealet og ikke på selve det eksisterende stationsareal. Der etableres sivesø, der hvor vandstrømningerne naturligt vil lede vandet hen.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er		x	Projektområdet omfatter ikke arealer, der af Miljøministeriet er udpeget som risikoområde for oversvømmelse, jf. Kystdirektoratets kortlægning "Sammenfatning af risikostyringsplaner for oversvømmelse for Vanddistrikt Sjælland" / "Sammenfatning af risikostyringsplaner for oversvømmelse for Vanddistrikt Jylland og Fyn" af december 2021 .

udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	Der er i samme området givet tilladelse til etablering af solcelleanlæg. De kumulative effekter vurderes som støj og forstyrrelsen fra anlægsaktiviteter, såsom transporter og oplagspladser i området. Da det forventes at der ved det kommende solcelleanlæg er en anlægsperiode på 25 uger, er det vurderingen at solcelleanlægget er etableret når Energinet påbegynder anlægsarbejdet med station Mesballe.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der er i Projektbeskrivelsen redegjort for tilpasninger. Det drejer sig væsentligst om: • Linjeføringen til kabelanlægget er i videst mulige omfang lagt den berører fredskoven mindst mulig. • Undgå nærhed til beboelser • På højspændingsstationen udskiftes støjende komponenter med nye, der har en lavere støjemission. • Regnvandshåndteringen på stationerne opgraderes i forbindelsen med udskiftningen med olieopsamling og nedsivningsanlæg

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 23. juni 2023 Bygherre/anmelder: Energinet, Att. Tine Marquard

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.
