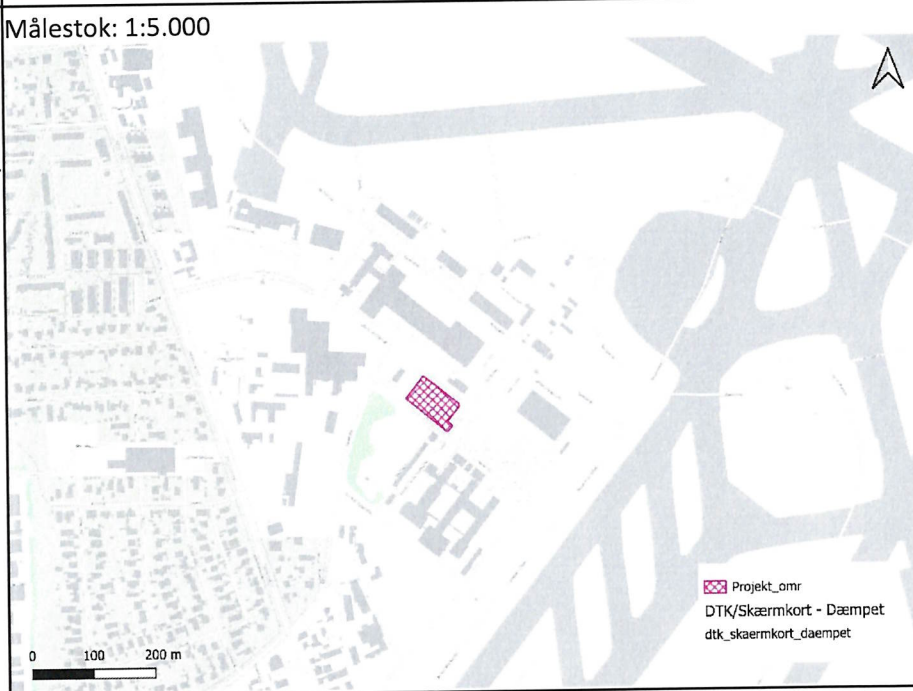


Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Københavns Lufthavn (CPH) ønsker et nyt rense- og behandlingsanlæg for gadeopfej, sand fra sandfangsbrønde samt olie fra olieudskillere. Det eksisterende rense- og behandlingsanlæg er forældet med mange manuelle funktioner. Det eksisterende rense- og behandlingsanlæg er desuden ikke designet for fjernelse af PFAS. CPH ønsker derfor at etablere et nyt rense- og behandlingsanlæg, hvor der også åbnes op for fjernelse af PFAS. Det nye rense- og behandlingsanlæg placeres ca. 200 meter vest for det eksisterende rense- og behandlingsanlæg. Placeringen er fortsat indenfor lufthavnens eget areal. Ved at flytte placeringen er det muligt at opretholde driften af det eksisterende rense- og behandlingsanlæg mens det nye bygges. Det nye rense- og behandlingsanlæg er mere pladskrævende og derfor ikke kan etableres på den eksisterende placering. Indenfor den nye placering etableres der udover selve rense- og behandlingsanlægget også garageanlæg med værksted til fejmaskiner, slamsuger m.v. samt en personalebygning. I rense- og behandlingsanlægget adskilles den faste fraktion fra den vandige, så den faste del kan håndteres separat. Den flydende del gennemgår en renseproces til sikring af, at virksomhedens spildevand kan overholde vilkårene i tilslutningstilladelsen til Tårnby Forsynings offentlige spildevandssystem for delområde Vest 2 – Maglebylille. Der forventes et årligt flow på ca. 8.000 m³ gennem rense- og behandlingsanlægget. Rense- og behandlingsanlægget vil bestå af følgende komponenter: • Dræncontainer for håndtering af gadeopfej. • Dræncontainer for håndtering af sand fra sandfangsbrønde. • Oliekar for modtagelse af vand, olie m.m. fra tømning af olieudskillere. • Efter hver dræncontainer etableres sandfang for yderligere udskillelse af sand fra den afdrænede væske. • Sandfang og olieudskiller efter oliekar inden buffertank 2 • 2 stk. buffertanke inden rensning • Renseanlæg for PFAS, 1. trin (Flokkuleringsanlæg) • Renseanlæg for PFAS, 2. trin (aktivt kul og resin samt evt. biologisk rensning) • Anlæg for afvanding af slam.

Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Tlf.: 32 31 32 31 Kundeservice@chp.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Sille Juhl Prang, HO Enviromen.Mgmt & Comp. Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 2770 Kastrup Email: sille.prang@cph.dk Tlf.: 31 38 67 45
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Københavns Lufthavne A/S Vilhelm Lauritzens Allé 12 2770 Kastrup Matrikelnummer: 130a, Lufthavn, Maglebylille By, Tårnby
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Tårnby Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Målestok: 1:50.000

	 0 1 2 km Projekt_omr DTK/Skærmkort - Dæmpet dtk_skaermkort_daempet		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Målestok: 1:5.000  0 100 200 m Projekt_omr DTK/Skærmkort - Dæmpet dtk_skaermkort_daempet		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:


Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 11: Andre anlæg C) Renseanlæg (projektet, som ikke er omfattet af bilag 1)
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherre er ejer af projektområdet.		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	• Dræncontainer for håndtering af gadeopfej • Dræncontainer for håndtering af sand fra sandfangsbrønde • Oliekar for modtagelse af vand, olie m.m. fra tømning af olieudskillere. • Efter hver dræncontainer etableres sandfang for yderligere udskillelse af sand fra den afdrænede væske. • Sandfang og olieudskiller efter oliekar inden buffertank 2 • 2 stk. buffertanke inden rensning • Renseanlæg for PFAS, 1. trin (Flokkuleringsanlæg) • Renseanlæg for PFAS, 2. trin (aktivt kul og resin samt evt. biologisk rensning) • Anlæg for afvanding af slam. Det samlede fremtidige samlede bebyggede areal i m²: ca. 860 m² Fordelt på: • Garageanlæg: 260 m² • Behandlingsrummet: 250 m² • Øvrige: 350 m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m²: ca. 2.640 m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²: ca. 3.500 m²		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning. Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ²	Projektets samlede grundareal: ca. 3.500 m² Projektets bebyggede areal i m²: Ca. 860 m² (uden containere) • Garage på ca. 260 m² • Behandlingsrummet på ca. 250 m² • Øvrige på ca. 350 m² Projektets nye befæstede areal i m²: ca. 2.640 m²		

Projektets bebyggede areal i m ²	Projektets samlede bygningsmasse i m³:										
Projektets nye befæstede areal i m ²											
Projektets samlede bygningsmasse i m ³											
Projektets maksimale bygningshøjde i m											
Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet											
	<table><tr><th>Bygning</th><th>Ca. Bygningsmasse [m3]</th></tr><tr><td>Garage</td><td>Ca. 1.850</td></tr><tr><td>Behandlingsrummet</td><td>Ca. 1.750</td></tr><tr><td>Øvrige</td><td>Ca. 2.450</td></tr><tr><td>I alt ca.</td><td>Ca. 6.050</td></tr></table>	Bygning	Ca. Bygningsmasse [m3]	Garage	Ca. 1.850	Behandlingsrummet	Ca. 1.750	Øvrige	Ca. 2.450	I alt ca.	Ca. 6.050
Bygning	Ca. Bygningsmasse [m3]										
Garage	Ca. 1.850										
Behandlingsrummet	Ca. 1.750										
Øvrige	Ca. 2.450										
I alt ca.	Ca. 6.050										
	Projektets maksimale bygningshøjde: ca. 7,5 m										
	Grundvandssænkning i forbindelse med projektet: Der vil ikke være behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet										
	Nedrivningsarbejder: Det er ikke nødvendigt at foretage nedrivningsarbejder i forbindelse med etablering af det nye rense- og behandlingsanlæg. Projektet omfatter nedrivning og bortskaffelse af det eksisterende rense- og behandlingsanlæg, som bliver overflødigt, når det nye anlæg er i drift. Den eksisterende bygning er ca. 117 m2 (se nedenstående figur) og der kan forefindes byggematerialer, som skal håndteres som forurenet affald (P1 og P2). Hvor disse må forekomme, håndteres og bortskaffes disse efter gældende regler for farligt affald. Eksisterende beholdere og nedgravede tanke (setlingstank, pumpetank, buffertanke og spildevandstank til sæbevand) vil blive sløjfet eller bortskaffet efter gældende regler.										
	CPH Målforskel: 1:462 Dato: 18-03-2026 Udskrevet af: David Jørgen Mathiasen Signaturforklaring: Luftfoto 2025 tema: arkitektur_2025 Vej: Veje Standplads områder: Standplads Bane og rulleveje: Standplads (Runway) identifikation: taxiway										
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden	I anlægsfasen vil der blive benyttet de typiske byggematerialer, vand m.v. Der vil blive benyttet energi til drift af byggepladser i form af belysning, entreprenørmaskiner m.v.										

Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Anlægsperioden: Q3-2026 – Q4 2027
Projektets karakteristika	Tekst
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Anlægget behandler ca. 8.000 m³ processpildevand om året. Heraf udgør nedbør fra det befæstede areal i gruber ca. 500 m³ På rense- og behandlingsanlægget skal der behandles "affaldsprodukter" fra følgende aktiviteter: • Tømning af støvsugere, der renholder veje, cykelstier, fortove, P-pladser, baner, rulleveje og standpladser m.m. • Tømning af slamsugere, der renholder sandfangsbrønde. • Tømning af slamsugere, der renholder olieudskillere på overfladevandsystemet og spildevandssystemet. Her tømmes sandfang, væskefase og olieamre samtidigt. • Tømning efter sæbe rengøring af gummi på belægninger – olie/sæbevand Fælles for de tre første "affaldsprodukter" er, at de er normalt forekommende i affaldssystemer for overfladevand. Det forventes, at der dagligt vil være tømning af optil 2 store og 2 små støvsugere, 1 slamsuger og 1 fejmaskine fra Brd. Hedegaard og 3 slamsugere fra eget regi. I alt optil ca. 55 m³ på en dag. Vandfasen fra alle "affaldstyper" opsamles i 2 buffertanke inden det ledes videre til behandling. De to buffertanke er begge på 25 m³. Efter behandling ledes vandet til Tårnby Forsynings offentlige spildevandssystem.

Nuværende tilslutningstilladelse er meddelt af Tårnby Kommune den 25. marts 2023.

Nuværende tilslutningstilladelse rummer procesvand fra eksisterende rense- og behandlingsanlæg, og det forventes at procesvand fra det nye rense- og behandlingsanlæg derfor kan rummes indenfor eksisterende tilslutningstilladelse. Det er afløb 2 (Vest 2 – Maglebylille), som både det eksisterende og det nye rense- og behandlingsanlæg leder procesvand til. Se nedenstående kort.

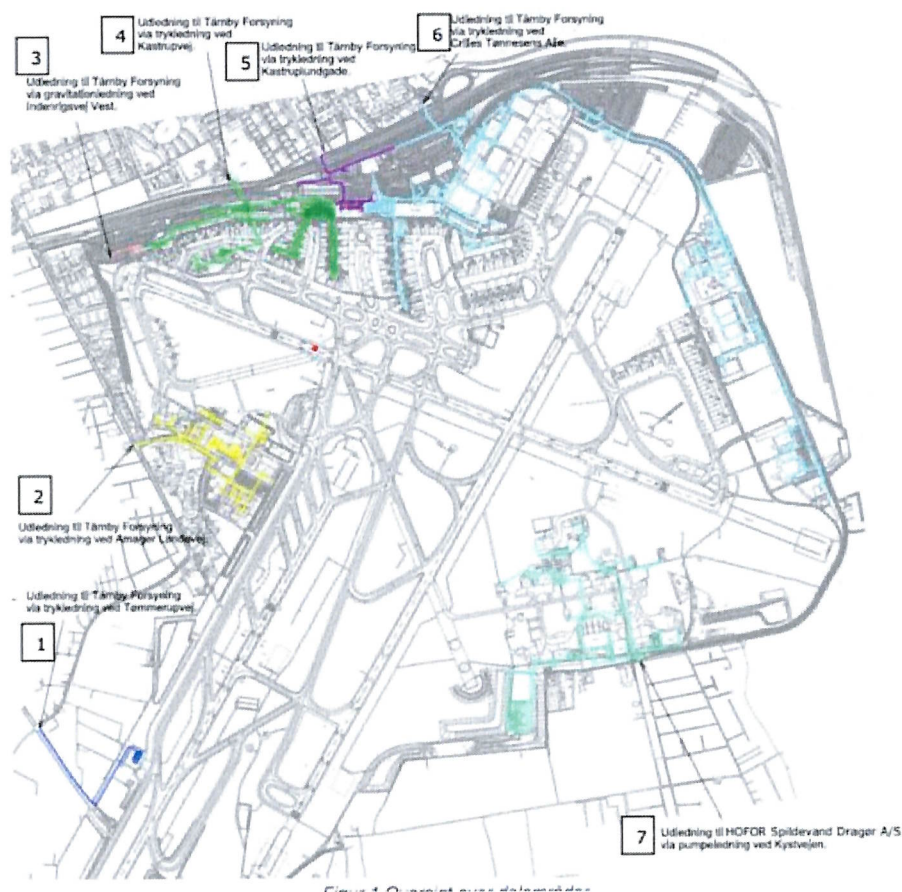

Hjælpe midler til brug i rense- og behandlingsanlægget, forbrug pr. år:

Hjælpe stof	årsforbrug
pH justering, syre*	
pH justering, baser (LUD) (NaOH – 30 %)	400 liter
Koagulant	3.200 liter
Flokkuleringsmiddel til PFAS, Fluorflok	2.400 liter
Generel flokkuleringsmiddel, Polymer	200 liter

**forventer ikke at skulle bruge syre, da flokkuleringsmidlet er surt*


6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: De samlede mængder "affald", der modtages på rense- og behandlingsanlægget, varierer fra dag til dag og uge til uge, men der forventes ca. 2-4 støvsugere pr. dag,

Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	0-4 slamsugere med materiale fra sandfangsbrønde pr. dag og 0-3 slamsugere med affald fra olieudskillere pr. dag.		
	Modtaget affaldsfraktioner		Årlig mængde
	Feje-/gadeopfej (afdrænet)		340 tons
	Sand fra sandfangsbrønde (afdrænet) m. PFAS under jordkvalitetskriteriet		100 tons
	Sand fra sandfangsbrønde (afdrænet) m. PFAS over jordkvalitetskriterier		20 tons
	Olie og slam fra oliekar		100 tons
	Slam fra slampresseren		40 tons
	Olieholdigt fast affald		25,7 tons
	Aktivt kul		2.400 liter
	Resiner		1.800 liter
Spildevand til renseanlæg: se pkt. 5. Overfladevand med direkte udledning: - Tagvand ledes gennem sandfang til regnvandssystemet. - Befæstede areal – ledes gennem olieudskillere og sandfang til regnvandssystemet. Der er eksisterende udledningstilladelse for U5. Hvor andet ikke er oplyst i miljøgodkendelsen, ledes spildevand fra rense- og behandlingsanlægget i henhold til CPH's tilslutningstilladelse.			
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse ?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10 Der er ingen standardvilkår for listepunkt H202. Lufthavne, flyvestationer og flyvepladser. Bilag 2.
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.

branchebekendtgørelsen?			
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Miljøstyrelsens vejledning nr. 5 / 1984 " Ekstern støj fra virksomheder " (PDF)
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen Der vil være støj i mindre omfang fra doseringsanlæg og pumpeanlæg. Herudover vil der være støj i forbindelse med transporter samt fra udskiftning af containere og aflevering af slam, opfej m.v. Anlægget giver ikke anledning til støjgener.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og	X		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.

bekendtgørelser om luftforurening?			Virksomheden er omfattet af luftvejledningen, som vil blive overholdt.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Det kan ikke udelukkes, at der i forbindelse med anlægsfasen i tørre perioder kan være støvgener. Støv bekæmpes med vanding.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. Virksomheden er omfattet af lugtvejledningen, som vil blive overholdt. https://mst.dk/media/5szdsic3/lugtvejledningen_1985.pdf Rensningen foretages hovedsageligt i lukkede systemer, der er derfor ikke behov for særlig luftudskiftning som helhed. Dog installeres der en punkudsugning over flotationen. Der er afkast fra slamcontaineren, som normalt ikke giver anledning til lugtgener, men det kan forekomme. Derfor opsættes der punkudsugning på slamcontaineren. Herudover vil der være et almindelig ventilationsanlæg fra garage og personalebygning. Alle afkast føres over tag.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne	x		Hvis »ja« angives og begrundes omfanget. Rense- og behandlingsanlægget vil være i drift døgnet rundt. I de mørke timer vil der være behov for udendørs


oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?			belysning. Belysningen vil være rettet mod arbejdsarealerne, og vil derfor ikke være til gene for naboer.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X	Hvis »ja« angiv hvilke:
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	X		Der er ca. 2,25 km til kystlinjen.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X	

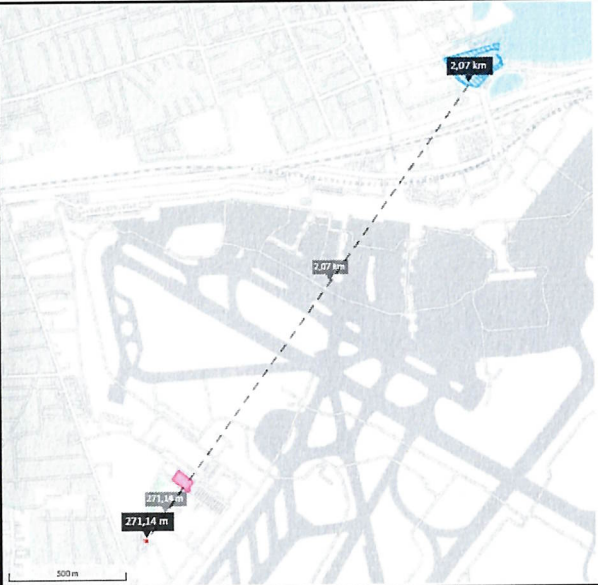			
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Ifølge arealinformation: Der er ca. 3,5 km til Natura 2000-området Vestamager og havet sydfor, som både er Fuglebeskyttelsesområde og Habitatområde. 
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?		X	Ifølge arealinformation: Projektet er placeret i område med "drikkevandsinteresser" men ikke med "særlige drikkevandsinteresser". Der er drikkevandsboringer, som er i drift, som er beliggende 500-600-m nordvest for placering af det nye rense- og behandlingsanlæg (LU1 og LU2).

37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?

X

Arealet er V2-kortlagt.

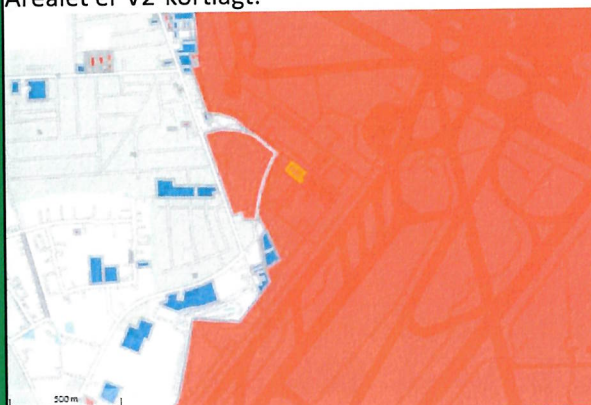

I maj måned 2025 er der på Elle Hammersvej 11, 2770 Kastrup udført en kombineret Geoteknisk- og miljøteknisk undersøgelse. Det vurderes i rapporten, at jorden i området for det nye rense og behandlingsanlæg ikke indeholder olie eller tjærestoffer. Der er påvist indhold af metaller i jorden svarende til lettere forurenede i 7 jordprøver, og i en enkelt prøve i MD1 er der i dybden 0-0,4 påvist indhold af bly, svarende til klasse 4 (kraftig forurenede iht. Jordplan Sjælland).


Hele området befæstes med asfalt og beton. Beton betragtes som en tæt belægning. Der sker kontrolleret afledning af overfladevand for alle arealer, som tidligere beskrevet.

Bygningen til rense- og behandlingsanlægget etableres med betongulve.

Tankene er enkeltvæggede og står i en betongrube

I forhold til de underjordiske rør og brønde er der foretaget følgende foranstaltninger for at undgå påvirkning af jord og grundvand:

- Brønde og ledninger udføres i PE med svejsede samlinger.
- Samlinger mellem støbte bygværker og rør udføres med omstøbte flanger og tætningsbånd.
- I bunden af ledningsgravene lægges et dræn, der forbindes med en mindre pumpebrønd så der kan oppumpes vandprøver til analyse af evt. drænvand omkring rør og brønde.

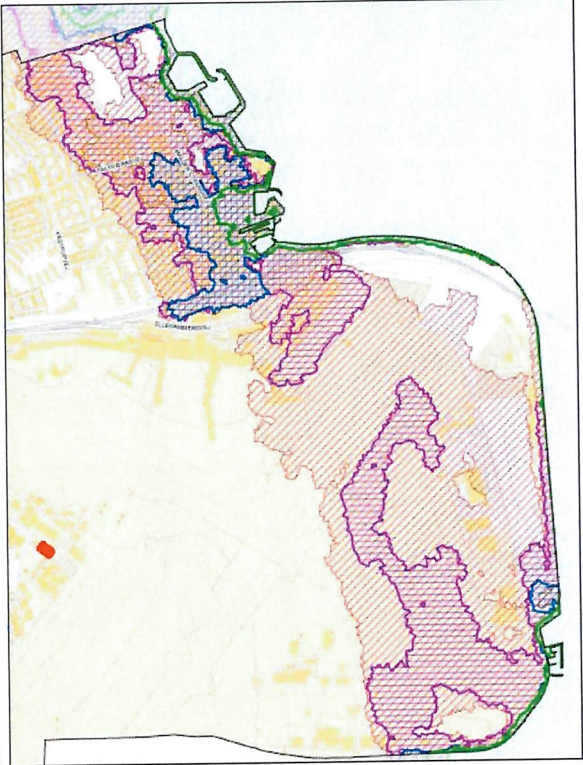			Med baggrund i den Geoteknisk- og miljøteknisk undersøgelse vurderes jorden i området ikke at være forurennet i en grad der kan påvirke drikkevandinteresser i og i nærheden. Det vurderes at risikoen for evt. påvirkning af indvindingsområdet for Tårnby kommune er ganske lille, og at der er taget forholdsregler mod dette.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	Jf. Plandata ligger området indenfor  https://dokument.plandata.dk/11_10909856_1658991051459.pdf
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Projektområdet er markeret med gult på nedenstående kortudklip og det røde område er risikoområder. 

			https://oversvømmelse.kyst.dk/risikoomraader-tredje-planperiode/koege-bugt-koebenhavn
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Projektet erstatter et ældre anlæg, som tages ud af drift.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Alle de udendørs arealer bliver befæstet dels med asfalt og dels med beton. Beton, som anses som en tæt belægning, etableres de steder, hvor der er mulighed for spild. Bygningen med rense- og behandlingsanlægget etableres med tætte gulve. Alle ledninger i anlægget er fuldsvejste PE-ledninger som er tætte.

43. Ansøgningen er oprindeligt indgivet den 18.12.2025 og genindsendes dags dato. 27.04.2026

Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 18/12-2025 Bygherre/anmelder: 

Ansøgningen genindsendes til myndigheden og undertegnede erklærer herved fortsat på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 24/04-2026 Bygherre/anmelder: 

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at

bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.
