

Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

**Dette er en revideret version af oprindeligt fremsendt ansøgningsskema, sendt til MST den 7. oktober 2019.12.17
Derudover er der tilføjet 'krydser' i felterne 24-26, 32, 36 og 37 efter telefonsamtale med Jakob Holm Knudsen den 17/12-2019.**

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Reinvestering af to 150 kV strækningen mellem Trige og Mesballe (MES-TRI1 og MES-TRI2) På de to 150 kV-forbindelser mellem Mesballe og Trige er levetiden for fasetråden og galvaniseringen på masterne ved at være opbrugt. Endvidere er isolatorer, armaturdele og fundamenter modne til renovering pga. alder. Renoveringen omfatter de eksisterende 150 kV-luftledninger Mesballe-Trige 1 fra 1963 og Mesballe-Trige 2 fra 1967, hvor de eksisterende fundamenter renoveres, fasetråde og jordtråde udskiftes med nye af samme type, isolatorer og armaturer udskiftes til komponenter efter gældende Energinet-standard, og masterne skiftes til nye af samme type og udseende. Se vedlagte fakta-ark i bilag 1 for yderligere uddybning. Udover metodebeskrivelserne i bilag 1, der beskriver renoveringsarbejderne, skal der i hele anlægsperioden etableres en såkaldt lus mellem de to luftledningsstrækninger. En lus er en midlertidig tråd-forbindelse, der muliggør at strømmen kan sendes fra den ene forbindelse til den anden. Lusen etableres som en del af beredskabsplanen, sådan at Djursland kan forsynes med strøm, såfremt der opstår en fejl i perioden for renoveringen. Se vedlagte beskrivelse med fotos i bilag 5. Flere detaljer findes i: Bilag 1: Fakta-ark med beskrivelse af renoveringsarbejderne. Bilag 2: Oversigtskort 1:100.000 for hele projektet Bilag 3: Kort med visning af master placeret inden for § 3-beskyttede naturområder Bilag 4: Lodsejerliste Bilag 5: Beskrivelse af etablering af lus
Navn, adresse, telefonnr. og e-	Energinet

mail på bygherre	Tonne Kjærvej 65 7000 Fredericia Tlf.: 70 10 22 44 e-mail: info@energinet.dk		
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Brian Kastbjerg Petersen Energinet, Arealer og Rettigheder Tonne Kjærvej 65 7000 Fredericia Tlf.: 30 69 50 04 e-mail: btp@energinet.dk		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Luftledningsstrækningerne er hhv. ca. 20 km og 25 km for MES-TRI1 og MES-TRI2 og krydser dermed mange matrikler, som er oplistet i bilag 4. Matriklerne der berører af lusen fremgår ligeledes af bilag 4.		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Syddjurs og Aarhus kommuner		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Oversigtskort i målestok 1:100.000 er vedlagt i bilag 2. Yderligere kort kan fremsendes efter ønske.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Ej vedlagt.		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Udskiftning af luftledninger og master er omfattet af punkt 13a: Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).

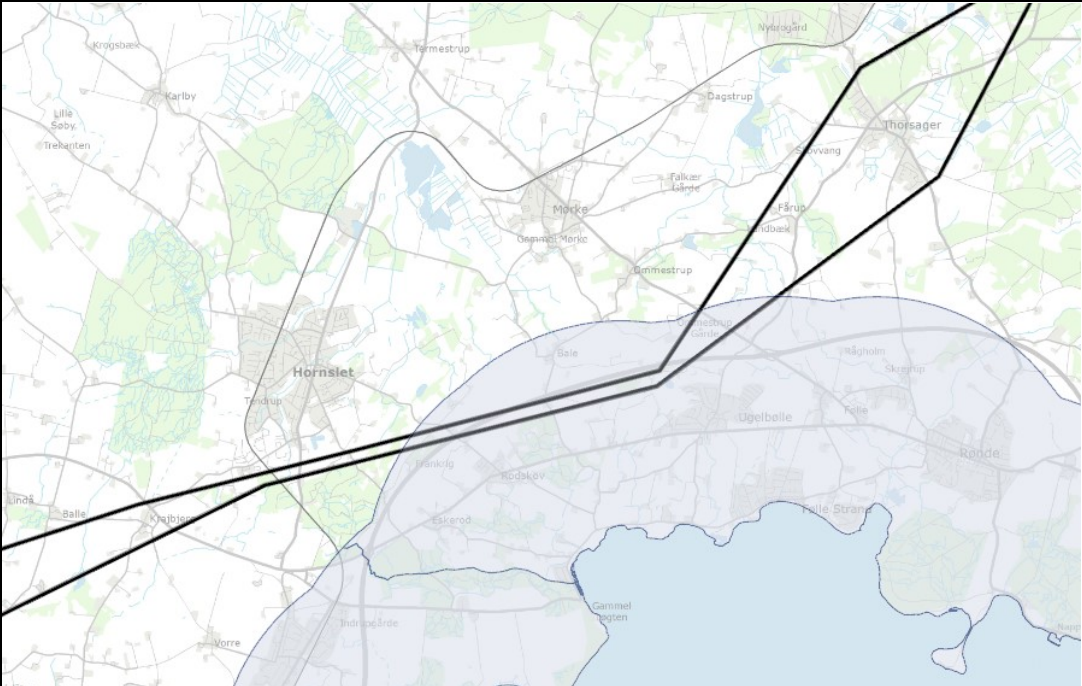
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Se bilag 4 med vedlagte lodsejerliste. Der forefindes servitut for luftledningerne, som giver Energinet adgang til at servicere og vedligeholde anlægget.		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Arealanvendelsen og det servitutbelagte areal under luftledningsanlæggene TRI-MES1 og TRI-MES2 er uændret efter projektets gennemførelse. Det fremtidige samlede bebyggede og befæstede areal er uændret. Der vil ikke blive befæstet nye arealer ifm. projektet.		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	I forbindelse med renoveringen på luftledningerne etableres der 1 midlertidig bygge-/oplagsplads af ca. 9.500 m², placeret på adressen Grimsbrovej 20, Todbjerg, 8530 Hjortshøj, for oplag af master, køreplader, kabel/leder, entreprenørmaskiner og byggepladshegn. Det permanente arealbehov for luftledningen vil ikke ændres i forhold til det eksisterende, hverken horisontalt eller vertikalt, idet masterne udskiftet med nye af samme type som de eksisterende. Masternes højde varierer mellem 15m og 35m. Der er ikke behov for grundvandssænkning. Såfremt der bliver behov for simpel tørholdelse ifm. renovering af fundamenter for eksempel efter længerevarende regnperioder søges tilladelse hos pågældende kommune.		
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i	Råstoffer: Strækningen for Mesballe-Trige 1 er ca. 20 km og Mesballe-Trige 2 ca. 25 km, til sammen ca. 45 km. Lederen er lavet af aluminium/stål og vejer ca. 2160 kg /km. Der skal anvendes ca. 135 km leder, i alt ca. 292 ton. Masterne vejer mellem 1,950 kg og 8,100 kg. Samlet beløber Mesballe-Trige 1 op i ca. 174 ton (inkl. Galvanisering) og Mesballe-Trige 2 op i ca. 290 ton (inkl. Galvanisering), totalt ca. 464 ton. Isolatorerne består af en fiberglas stang med HTV-gummi. Der er i alt 150 master med hver 3 faser. I alt monteres ca. 385 hængekæder som vejer ca. 25 kg, i alt 9,6 ton. Der monteres ca. 35 brudsikre hængekæder af 60 kg, i alt 2,1 ton. Der monteres ca. 40 afspændingskæder af 75 kg, i alt 3 ton og 15 brudsikre afspændingskæder af 80 kg, i alt 1,2 ton. Samlet ca. 16 ton komposit-		

anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	isolatorkæder. Affald: Affaldet består af de nedtagne master, tråd og glas-isolatorer samt mindre mængder armeret beton fra de af fundamentene der renoveres. Mængderne svarer til ovenfor nævnte. Der vil være begrænset mængde andet byggeaffald og overskudsjord. Der genereres ikke spildevand. Afledning af regnvand sker ved nedsivning. Anlægsarbejderne vil foregå i perioden fra 03/20-02/21		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	I driftsfasen transmittere anlægget udelukkende strøm, og der oplagres ikke materialer i forbindelse med anlægget. Der er ingen mellemprodukter. Ud over strøm leveres der ikke færdigvarer. Der anvendes ikke vand i driftsfasen.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	Anlægget transmitterer udelukkende strøm, og der vil ikke genereres affald, der skal håndteres i driftsfasen ud over når anlægget eller dele heraf skal udskiftes. Luftledningsanlægget vurderes at have en levetid på minimum 40 år efter renoveringen. Udtjente komponenter vil blive bortskaffet i henhold til gældende regler på udskiftningstidspunktet. Spildevand: Forekommer ikke. Regnvand: Afledning af regnvand vil ske ved nedsivning.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x	
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10

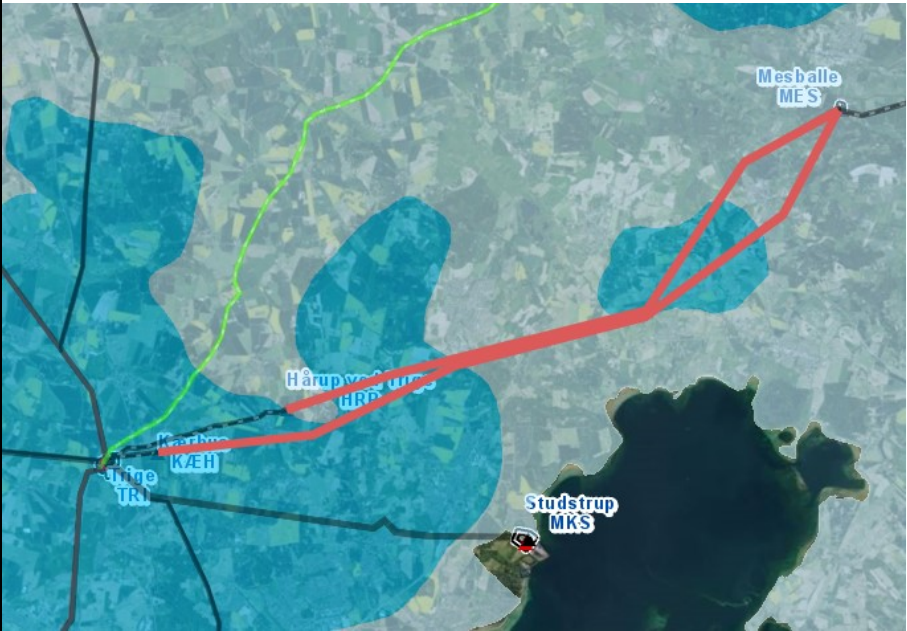
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?			Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Stationsanlæggene er omfattet af følgende: - Vejl. nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" (Støjvejledningen) - Vejl. nr. 6/1984 "Måling af ekstern støj fra virksomheder" - Vejl. nr. 5/1993 "Beregning af ekstern støj fra virksomheder" - Vejl. nr. 3/1996 " Supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder" - Vejl. nr. 3/2003 " Ekstern støj i byomdannelsesområder" - Tillæg til vejl. nr. 5/1984 "Ekstern støj fra virksomheder" - Orientering fra Miljøstyrelsen nr. 9/1997 "Lavfrekvent støj, infralyd og vibrationer i eksternt miljø"
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		x	Anlægsarbejdet vil foregå indenfor normal arbejdstid. De væsentligste støjpåvirkninger vil være fra kørende materiel, der lejlighedsvist (ved forbikørsler og lign.) evt. vil overskride støjgrænserne for bolig i det åbne land. Der vil være fokus på at nedbringe gener mest muligt, som for eksempel at undgå at kørende materiel køre i tomgang. Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	x		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		x	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende	X		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

grænseværdier for luftforurening?			
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	x		Under anlægsarbejdet vil der ske emission af udstødningsgasser fra maskiner til arbejdets udførelse. Emissionen forventes at blive i et begrænset omfang og varighed. Derudover er der gode spredningsforhold inden for og omkring projektområdet.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Anlægsfasen: I anlægsperioden kan der forekomme enkelte støvdannelse på og omkring arbejdsbæltet på markerne ved udskiftning af luftledninger, specielt i tørre perioder, hvor jordpartikler hvirvles op, hvis maskiner kører på jordveje. I tørre perioder kan der efter behov f.eks. hvis der kommer klager sprinkles med vand for at dæmpe støvdannelsen i bymæssig bebyggelse og områder med rekreative anvendelser. Energinet forventer at sprinkle i tørreperioder, hvis der er ud fra en konkret vurdering vurderes at være behov for det. I vurderingen indgår klager fra naboer, og metoden anvendes i samråd med myndigheden med mindre andre muligheder kan løse genen. Driftsfasen: I driftsfasen er der ingen støvgener fra anlægget.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?		x	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	x		Anlæg: Der kan blive behov for lejlighedsvis brug af arbejdslys inden for normal arbejdstid. Som udgangspunkt arbejdes der indenfor normal arbejdstid og ikke i aften- og nattetimerne. Driftsfase: ingen behov for belysning.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	x		Projektområdet berører følgende områder omfattet af nedenstående lokalplaner i Syddjurs Kommune: - LP0067 – Boligområde ved Stationsvej, Thorsager - LP027 – KaløVigenes Golfbane, Ugelbølle

			Projektområdet berører følgende områder omfattet af nedenstående lokalplaner i Aarhus Kommune: • 398 – Hårup Landsby Projektet med udskiftning af eksisterende anlæg vil ikke være i konflikt med rammebestemmelserne for områderne i ovenstående lokalplaner.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	x		Der er tale om vedligehold og udskiftning af eksisterende anlæg til nye komponenter af samme type. Strækningerne krydser flere skovbeskyttelseslinjer. Krav om dispensationer afklares med og ansøges ved kommunerne.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	x		Der er indgået aftale med lodsejere om placering af oplagsplads. I perioden for anlægsarbejdet vil der således være begrænsninger for anvendelse af dette areal efter aftale med lodsejeren. Der vil med projektet ikke medføre begrænsninger til anvendelse af naboarealer uden for projektområdet i driftsfasen.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?	x		Luftledningsstrækningen fra TRI-MES1 mast 43-57 samt TRI-MES2 mast 45-65 ligger inden for kystnærhedszonen. Strækningerne er hhv. 4,8 km og 6,1 km og løber stort set parallelt. Projektet vil ikke medføre ændringer til det visuelle udtryk, da masteplaceringer fastholdes og masterne udskiftes med nye af tilsvarende type. Området er karakteriseret som åbent land med spredt bebyggelse og bevoksning flere steder.

			 Luftledningsstrækningerne er angivet med sort streg. Kystnærhedszone angivet med transparent grå farve.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		x	Det eksisterende anlæg er omfattet af en servitut, hvoraf det fremgår, at der ikke må plantes træer under luftledningsanlægget. I forbindelse med adgang til enkelte master kan det komme på tale at beskære eller fælde enkelte træer. Såfremt dette er nødvendigt i fredskov kontaktes Miljøstyrelsen med henblik på afklaring og evt. ansøgning.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x	Der er ikke kendskab til igangværende fredningssager i projektområdet.
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der findes flere områder beskyttet i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3 som projektområdet krydser. De registrerede § 3 områder, hvor der er placeret master vil blive berørt af projektet. Disse seks områder er vist på bilag 3. Områder, hvor der ikke er placeret master, vil ikke blive berørt af projektet, da tråden vil blive udskiftet i højden/luften uden at tråden kommer i kontakt med jorden.
32. Er der forekomst af	x		Syd for mast 78-79 på strækningen TRI-MES1

beskyttede arter og i givet fald hvilke?			Stor vandsalamander i sø ca. 70 m fra nærmeste leder. Stednavn: I477-04-sø <u>Nord for mast 6 på strækningen TRI-MES2</u> Butsnudet frø, spidssnudet frø, skrubtudse, lille vandsalamander i sø ca. 25 m fra nærmeste leder. Stednavn: I524-01-vh Butsnudet frø, spidssnudet frø i sø ca. 40 m fra nærmeste leder. Stednavn: I524-06-sø (1)
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste større sammenhængende fredet område er Ugebølle Hoved, der er en arealfredning, hvor restriktive bestemmelser vedr. bebyggelse. Områdets nordlige kant er beliggende ca. 700 m fra TRI-MES2 strækningen. Det nærmeste fredet område er et areal rundt om Thorsager Kirke (kirkefredning) beliggende ca. 625 m fra TRI_MES2 strækningen.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste Natura 2000-område er H230 - Kaløskovene og Kaløvig (EF-habitatområde), der er beliggende knap 3 km syd for strækningen TRI-MES2. <u>Naturtyper på udpegningsgrundlaget:</u> Sandbanke Vadeflade Lagune Bugt Rev Strandvold med enårige planter Strandvold med flerårige planter Enårig strandengsvegetation Strandeng Næringsrig sø Kalkoverdrev Tidvist våd eng Kildevæld Rigkær Bøg på mor Bøg på muld Bøg på kalk Ege-blandskov Elle- og askeskov <u>Arter på udpegningsgrundlaget:</u> Sumpvindelsnegl Stor vandsalamander
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		x	Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige	x		Dele af luftledningsstrækningerne er placeret i områder, der er registreret med særlige drikkevandsinteresser. Områderne, hvor der er registreret særlige drikkevandsinteresser er vist på nedenstående kort. Luftledningerne er

drikkevandinteresser?			angivet med rød streg.
			
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?	x		Luftledninger krydser enkelte V1 og v2 kortlagte områder. På strækningen TRI-MES1 er mast 136 placeret indenfor V2- kortlagt areal.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		x	Ifølge Syddjurs Kommunes klimatilpasningsplan fra 2014 (seneste) er udfordringerne ift. oversvømmelse primært ved byerne, byggeri og anlæg ved kysten, byggeri og anlæg i Kolindsund og enkelte steder i det åbne land. Traceerne forløber i det åbne land, og passere enkelte af de udpeget områder. Udfordringerne i det åbne land ses de steder, hvor der er store bygningsværker, gårde eller herregårde, ved enkelte landsbyer eller en større flade af kulturmiljøer. Indsatserne for landområderne er: 1. at kommunikere med borgere om servicemål og understøtte initiativer hos borgere og virksomheder 2. at undersøge, om eksisterende lavbundsarealer kan anvendes til at løse problemstillingerne med oversvømmelserne i byerne og på gode landbrugsjorder gennem dialog med landbruget og eventuelt mageskifte (jordbytte) med kommunalt ejet jord Ifølge Aarhus Kommunes klimatilpasningsplan er der ligeledes udpeget enkelte steder i det åbne land som lavninger, der vil blive oversvømmet ved skybrud eller vandløb og søer, som ved 100 års hændelser vil gå over bredderne og oversvømme nærliggende områder. Traceerne passerer enkelte af disse områder. Der er ikke fastlagt indsats i de berørte områder.

39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		x	Projektområdet omfatter ikke arealer, der af Naturstyrelsen er udpeget som risikoområde for oversvømmelse, jf. styrelsens kortlægning "Endelig udpegnings af risikoområder for oversvømmelse fra vandløb, søer, havet og fjorde" af december 2011.
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		x	Energinet er ikke bekendt med, at der er andre aktuelle projekter i området, som kan medføre en øget samlet påvirkning af miljøet.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Så vidt muligt undgås det at køre indover sårbare beskyttede naturområder. Skulle det være nødvendigt at krydse beskyttet natur vil der blive lagt køreplader ud og dispensation vil blive søgt ved kommunen og øvrige vilkår vil blive fulgt. Med mindre der er gunstige bundforhold vil der blive udlagt køreplader på alle køreveje. Der vil blive udlagt køreplader på arbejdspladserne, så maskinerne ikke synker ned i den jordbunden. De involverede kommuner er på forhånd blevet kontaktet ift. natur og miljømæssige problemstillinger. Endvidere kontaktes Moesgaard Museum og Museum Østjylland i forhold til evt. arkæologiske og kulturhistoriske problemstillinger.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 12/12-2019 Bygherre/anmelder: Brian Kastbjerg Petersen, Energinet

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.
