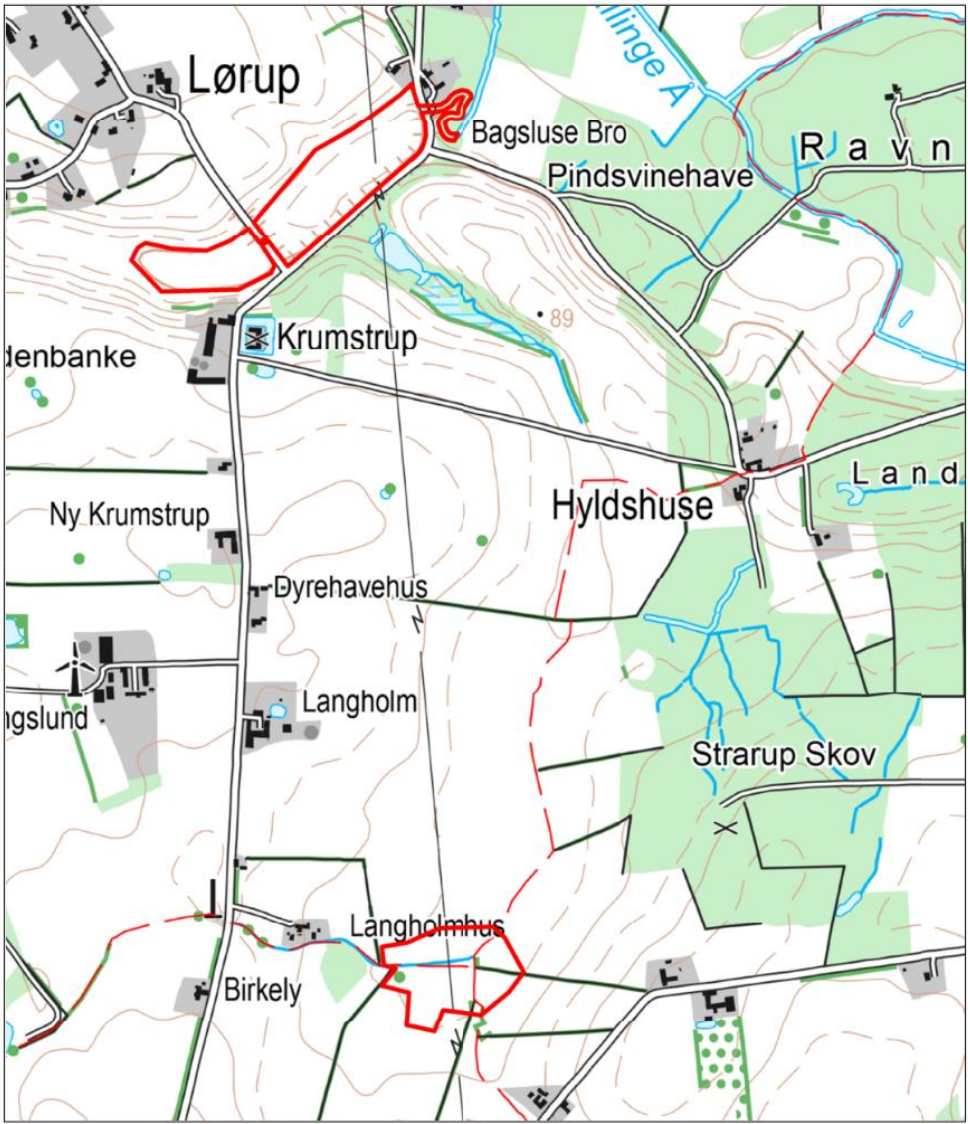


Bilag 1

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projektet ligger sydøst for Ringe. Det har til formål at reducere udledningen af kvælstof til Odense Fjord, men lægger samtidig vægt på at øge områdets naturværdi. Projektet omfatter to dele. Ved vandløbet Sogneskellet åbnes et rørlagt vandløb og vandløbsbunden hæves, så terrænet bliver vådere. Dette område er 2,69 ha. Ved Krumstrup Møllebæk genskabes den tidligere møllesø, på et areal, der nu er en mark i omdrift med et rørlagt vandløb. Søen vil få et areal på 2,61 ha, en maksimal dybde på 2,0 m og en gennemsnitlig opholdstid på 6,7 dage. Søen får afløb gennem en ny underføring af Krumstrupvej og et slynget forløb på 230 m gennem ejendommen i Krumstrupvej 8 til det nuværende vandløb. Dette areal er 5,13 ha, så det samlede projektareal er 7,82 ha. Beregninger viser, at projektet vil reducere udledning af kvælstof med 1.734 kg N/år svarende til 222 kg/ha/år. Udledningen af fosfor er ifølge den anviste beregningsmetode 45,8 kg/år. For en detaljeret beskrivelse af projektet henvises til forundersøgelsesrapporten "Vådområdeprojekt Sogneskellet og Krumstrup Møllebæk. Teknisk Forundersøgelse" fra december 2019, der er vedlagt. Sideløbende med den tekniske forundersøgelse har Naturstyrelsen foretaget en ejendomsrættlig forundersøgelse, som konkluderede, at lodsejerne ønsker at genskabe den tidligere møllesø, men at der kun er tilslutning til et mindre projekt ved Sogneskellet end oprindeligt planlagt. Den tekniske forundersøgelse beskriver både det oprindelige forslag (Forslag 1) og det reducerede (Forslag 2), men det er kun forslag 2, som gennemføres.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Naturstyrelsen Sollerupvej 24 5600 Faaborg Tlf. 7254 3000
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Kontaktperson bygherre: Martin Nissen Nørgård Naturstyrelsen Tlf: 9356 4100 Mail: marno@nst.dk Kontaktperson rådgiver: Bo Christensen COWI Parallelvej 2 2800 Kgs. Lyngby Tlf: 5640 2976 Mobil: 2989 1953 Mail: BOC@cowi.com
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske	Krumstrupvej, 5750 Ringe. Se også nedenfor.

placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Faaborg-Midtfyn Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	 Det reducerede projektområde. Målforhold ca. 1:20.000
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af	Målestok angives: Se vedlagte kortbilag

anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).			
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: Projektet vurderes at være omfattet af følgende punkter på miljøvurderingslovens bilag 2: • Punkt 1 c) Vandforvaltningsprojekter inden for landbruget, herunder vandings- og dræningsprojekter. • Punkt 10 f) Anlæg af vandveje, som ikke er omfattet af bilag 1, kanalbygning og regulering af vandløb. • Punkt 10 g) Dæmninger og andre anlæg til opstuvning eller varig oplagring af vand (projekter, som ikke er omfattet af bilag 1).
Projektets karakteristika	Tekst		
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Matrikler inkluderet: • 1a Krumstrup Hgd., Ryslinge - Krumstrupvej 10, Thomas Eggertsen • 5 Gultved By, Kværndrup - Gultvedgyden 14, Søren Vaagelund Galsgaard • 9a Gultved By, Kværndrup - Strarupvej 12, Lis og Allan Christensen • 3f Krumstrup Hgd., Ryslinge - Krumstrupvej 0, Thomas Eggertsen • 48 Sandager By, Gislev - Mullerupvej 16B, Jens Friis Vistrup • 12g Sandager By, Gislev - Krumstrupvej 10, Thomas Eggertsen		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m² Det fremtidige samlede befæstede areal i m² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Projektet ændrer ikke på det bebyggede areal. Projektet ændrer ikke på det befæstede areal. Der befæstes ikke nye arealer i forbindelse med projektet.		
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² Projektets bebyggede areal i m² Projektets nye befæstede areal i m² Projektets samlede bygningsmasse i m³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i	• Der vurderes ikke at være et behov for grundvandssænkning. • Projektets samlede areal udgør 7,82 ha. • Projektet omfatter ikke etablering af bygninger • Ved etablering af rørunderføringen under Krumstrupvej opbrydes asfalten og røret nedgraves, hvorefter der lægges ny asfalt. Herudover sker der ikke befæstning af arealer. Der befæstes ikke nye arealer i forbindelse med projektet. • Projektet omfatter ikke etablering af bygninger. • Der er ikke behov for egentlige nedrivningsarbejder. Asfalt vil opbrudt i et meget lille omfang i forbindelse med nedgravning af røret under Krumstrupvej og der er enkelte dræn, som sløjfes.		

forbindelse med projektet			
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	- I forbindelse med etableringen af røret under Krumstrupvej vil der være behov for beton, sand/grus samt lidt asfalt. Der vil være tale om ubetydelige mængder. - Der er ikke behov for vand i anlægsfasen. - I forbindelse med anlægsarbejdet vil rester af opbrudt asfalt og rester af rør blive bortskaffet til genanvendelse ved godkendt modtager. - Projektet genererer ikke spildevand. Evt. sanitært spildevand i anlægsfasen opsamles og køres til offentligt renseanlæg. - Regnvand vil nedsive eller løbe til vandløb som i dag. - Den endelige tidsplan er ikke fastlagt, men det meste af anlægsarbejdet udføres bedst i perioden august-oktober. Rydning samt omlægning af spildevandsledningen kan med fordel udføres tidligere. Arbejdet vil vare ca. 3 måneder.		
Projektets karakteristika	Tekst		
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	- Projektet medfører en kvælstoffjernelse på 1.734 kg N/år svarende til 222 kg/ha/år fra vandmiljøet. - Da der ikke tale om en produktionsvirksomhed, så er det ikke relevant at tale om råstoffer, vand eller produkter/varer.		
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald: Spildevand til renseanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:	- Der genereres ikke affald eller spildevand i driftsfasen. - Regnvand vil nedsive eller løbe til vandløb som i dag.		
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		X	


8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 10
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	-	-	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke vilkår, der ikke vil kunne overholdes.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til pkt. 12.
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	-	-	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BREF-dokumenter, der ikke vil kunne overholdes.
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	-	-	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	(x)		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Opbrydning og lægning af asfalt vurderes at være omfattet af bestemmelserne for midlertidig anlægsaktivitet, og skal således meddeles til Faaborg-Midtfyns Kommune jf. kommunens forskrifter: https://www.fmk.dk/borger/miljoe-energi-og-affald/lugt-roeg-og-stoej/midlertidig-forurenende-aktivitet/
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	-	-	Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	-	-	Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener i anlægsperioden? I driftsfasen?	X	X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse. I forbindelse med gravearbejde som følge af projektet kan der genereres støv, hvis arbejdet sker i tørt og eller blæsende vejr. Da projektområdet i dag overvejende består af landbrugsarealer, så vurderes støvpåvirkningen dog ikke at være væsentligt forskellig fra den eksisterende påvirkning fra markarbejder.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener i anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne i anlægsperioden? I driftsfasen?		X X	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	X		Hvis »nej«, angiv hvorfor: Projektet er ikke beliggende i et lokalplanområde.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	(x)		Hvis »ja« angiv hvilke: Dele af projektområdet er beliggende indenfor skovbyggelinjer. Projektet vurderes dog ikke at være af en type eller karakter, hvor det kræver dispensation fra skovbyggelinjen. Indenfor projektområdet findes beskyttede sten- og jorddiger. I det omfang, der vil ske en påvirkning af disse, vil det kræve en dispensation.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	(x)		I forbindelse med nedgravning af nye rør, hvor vandløbet føres under vej, vil der kortvarigt være behov for lukke for trafikken på vejstrækningen (forventet ca. en dag). Projektet påvirker ikke naboarealer.
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X	

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højestammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)	X		For at etablere det nye afløb vil der være behov for rydning træbevoksningen inden for projektområdet (ca. 0,5 ha). Derudover bliver det formentlig nødvendigt at fælde andre træer, som blive udsatte for vind eller bør fældes af landskabelige grunde. Rydningen aftales med lodsejer. Det berørte skovareal er ikke omfattet af fredskovspligt.
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X	
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Projektområdet omfatter § 3-beskyttede vandløb samt en § 3-beskyttet eng ved Sogneskellet. Projektet vurderes at have en positiv effekt på disse naturtyper.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		X	Der er registreret beskyttede eller fredede arter indenfor eller i umiddelbar nærhed af projektområdet.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmest fredede område ligger ca. 1,9 km vest for projektområdet. Fredningen er arealfredningen Fuglegården Allé.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste habitatområde har H98 Odense Å med Hågerup Å, Sallinge Å og Lindved Å, der ligger ca. 1,9 km nordvest for projektområdet. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde er F74 Skove ved Brahetrolleborg, der ligger ca. 9 km sydvest for projektområdet. Nærmeste RAMSAR-område er nr. 17 Sydfynske Øhav, der ligger ca. 20 km syd for projektområdet.
35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?	X		Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om. Projektet vil påvirke overfladevand, men det må betragtes som projektets formål. Projektet omfatter åbning af rørlagte vandløb samt etablering af sø og vådområder. I de skabte vådområder vil der ske en fjernelse af kvælstof.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?	X		
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X	

38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.		X	
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Ansøger har ikke kendskab til andre projekter, der sammen med det ansøgte kan medføre kumulative virkninger på miljøet.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?			Der er i projektet indarbejdet enkelte afværgetiltag. Disse omfatter: • Omlægning af spildevandsledning, 63 mm, 200 m • Der lægges et 20 m langt dræn ved sydende af boligen på Krumstrupvej 8.

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 15/1 2021 Bygherre/anmelder: 

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.
